

Estacada de la Playa.

Junio de 1784

Quaderno 4.^o

Comisaria de Guerra

SE

N.º 1 + 1

Relacion en que se manifiestan los Jornaleros q han Derengado
el Mtro y oficiales de Carpinteria empleados en la R.ª Obra de Estacada
que se está construyendo en la Playa del Callao para Resguardo de la Cava
que sirve de Administracion de Rentas y Pasaques del Rey en esta
semana, que comenzó Miércoles 2.ª de Junio, y acabó Sábado 5.ª de dicho
con expresion de lo que en ella se ha executado, y es a saber

De te
Numeram se han labrado cuatro pedazos de
tabloner de Roble para formar una rueda para
el Martinete nuevo de clavar Estacas se han
labrado tres pedazos de suma de diez y ocho pul-
gadas de largo y de tres vu grueso su ancho cua-
tro pulgadas y media: estos para otra rueda
se ha echo una canal de los pies derechos del
Martinete se han acerrado seis mangtes
alos que se le han echo puntas avinientados
sus runchos q se Reciban el golpe del Marti-
nete, y se sigue trabasando.

Formales que han Devengado los Operarios siguientes

	Dia	Valor	Pesos	Reales
M ^{ro} . Juan Durio	5	à 30	5	—
Josef Ramirez	5	à 16	8	—
Fran ^{co} Izquierri	5	à 16	8	—
Clemente Laoliva	5	à 14	7	—
Exposicion de Formales			28	—

Por cuatro Formales	à 30	5
Por ocho dichos	à 16	16
Por cuatro dichos	à 14	7
		28

Dⁿ Miguel de Extremiana Subteniente de Infant^a Ingeniero Voluntario y Encargado del Detall de la P^{ta} Obra, y Fortificazⁿ del Callao.

Certifico que la Cantidad de veinte y ocho pesos, que arriba se expresa, es la misma que debe abonarse al M^{ro}, y Oficiales de Carpinteria, por el Trabajo, que tienen Devengado en d^{ta} P^{ta} Obra, la que se ha executado por Disposicion de Dⁿ Antonio Canabate Jefe de Infanteria Ingeniero Extraordinario de los Exercitos de S. M. y Comand^{te} en este Reyno, con intervencion de Don Josef Manuel de Tagle Comisario de Guerra, y Ministro de P^{ta} Obra, y de los Exercitos de S. M. Enparag^o como la firmé en la Plaza del Callao en 5^a de Junio de 1785.

P. B.

En mi Intervencion

Ant^o Canabate

Man. de Tagle
Paraga

Miguel de Extremiana

Recibi al S^{to} P^{ro} Juan^l de Tagle Paraga Com^o
P^{ro} y Ministro de P^{ta} Obra los veinte y ocho p^{os} y q^{ta}

Refieren en la Relación antecedente para lo fin
 q. en ellas se expresan. comitadas agüas 5 2

Sumo a 1784.

Son 28 p.

Juan Bello

Delas. en que manifest. los Tornater. q. han desengado el Mro. D.
 J. J. de Carpio en la Real Obra de la Casa que reedificó
 en la Playa del Callao p.º M.º de la Casa q. sabe de Ad-
 ministrac. de Rentas, y S.º de la Casa q. sabe de Ad-
 ministrac. de Rentas, y acabó sabado 12 de Mayo. con expresion de lo que en ella
 se executó, y el a saber.

De

se
 han aserrado quarenta maderos
 de los quales se han labrado diez y seis
 alos que se le han echo sus puntas hanu-
 endoles sus Tunchos para que queden
 el golpe del martinete, se ha labrado el otro
 pie dho. del martinete. Se han labrado
 quatro palos de suma de largo de diez y ocho
 pulgadas, y de tres su grueso, su ancho
 pulgada, y media esto para dha. maza que
 sabe de mano al martinete, y se que tra-
 bajando.

Tomales q. han devengado los Operas. Siguen.

Dias Valor P. R.

M ^o . Juan Buio	5	a	10	6	2
Francisco Benoezi	5	a	16	10	"
Clemente dela Oliva	5	a	14	8	6

Por Copreci. de Tomales. / 25. "

cinco Tomales	a	10	6	2
Por cinco d ^{os}	a	16	10	"
P. cinco d ^{os}	a	14	8	6

/ 25. "

Don Miguel de Gromana Subthe. de Infant. e Ingen. voluntario y encargado del Detall. dela R. Obra y fortificac^{on} del Callao.

Le confio quella cantidad de veinte y cinco p. q. as^u se apropiaran, esta misma q. debe abonarse, al M^o. y de Carpinteria p. el navazo q. tienen devengado en R. obra la que sea consumida p. dispos^{on} de D. An^{to} n^oabate Th^o de Infant. Ingen. Extraordin. de i^{to} de S. M. y Comand. en este Reyno conintenden. de Jose Manuel de Tagle Comisario de Guerra de los Estos de S. M. y para q. conste lo firmo en la Plaza de Callao, en 42 de Junio de 1784.

V. B.

Con mi Intervencion

Ant. Canabates

Miguel Estruina

~~Man. de Tagle~~
Navaga

Recibi el S. d. Jph Man. de Tagle

Traxaga comitaxio a gñra y mismo av. l. Ha
 2.^a los veinos y cinco p. q. se dicen en la Nacion
 antecedente para los fines q. en ella se expresan. Co-
 mitaxia a gñra 12 Junio 1784.

Son 25 p. 3.

Juan Buelo

N.º 5

Declaracion en que se manifiestan los Jornaleros que han devengado el
Mto y Ofiziales de Carpinteria empleados en la R.ª Obra de Estacada que
se esta construyendo en la Playa del Callao, para resguardo de la Cava
que sirve de Administracion de Rentas y Barracas del Rey en
esta Semana que comenzó Lunes 14 de Junio, y acabo Sabado 19 de
dicho, con expreccion de lo que en ella se ha executado y es averer

Primamente se han acerrado veinte
Mangler por ambas cabezas alor que
se le han echo sus puntas, aviniendole
sus Vunchos, para que reciban el golpe del
Martinete: se han clavado sesenta Estacas
se han puesto cinco Viortras con cinquenta
y ocho clavos de diez y seis, a diez y siete
pulgadas: se han labrado cinco pedrazos de
Lima para la rueda, que se esta construyendo
para el Martinete nuevo y se sigue trabasando.

Sornaler que han Devengado lo Operarios siguientes

Dias Valor P.^a A.^a

M ^{te} Juan Irujo	6.	a.	50.	7.	4.
Josef Ramirez	6.	a.	56.	12.	..
Francisco Berru	6.	a.	56.	12.	..
Clemente Labliva	6.	a.	54.	50.	4.
Manuel Roman	5.	a.	54.	18.	6.
Caymimo van Miguel	6.	a.	54.	50.	4.
Josef Bravo	5.	a.	55.	18.	6.

Expresion de Sornaler

70

Por veir Sornaler	a.	50.	7.	4.
Por doze Sornaler	a.	56.	24.	..
Por veinte y dos Sornaler	a.	54.	38.	4.
			70.	..

Miguel de Espinosa, Sub. de Jefe de Ingenieros Volun-
encargado del Detall de la A. obra y fortificaz del Callao. P.

Partido que la Com. de guerra que arriba se expre-
sa es la misma que debe abonarse al M^{te} y Jefe de
el trabajo que tienen devengado, en T^a A. obra, la que se
ha executado por disposicion de Dⁿ Antonio Carrabate
Jefe de Ingenieros Extraordinario de los Ejercitos de
S. M. y Comand^{te} en este Puerto, con intervencion de Dⁿ
Josef Manuel de Fajó Comisario de Guerra y Marina
de la Hacienda de los Ejercitos de S. M. y Parag^o
como la firmé en la Plaza del Callao en 5^a de
Junio de 1784.

P. B.

Con mi intervencion

Ant^o Carrabate

Man. delgado

Miguel Estuñan

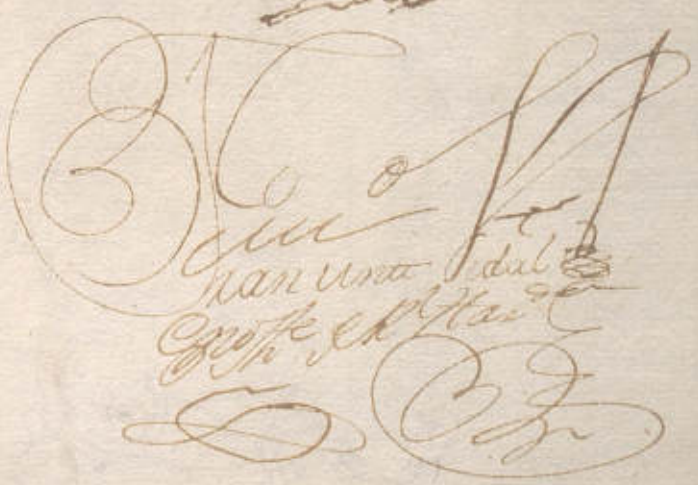
Recabi el S. 3.º de Jun. 1784

glo. Traxaga com^o agüa, y münio de. Han^{da}
los sacma pt. q. se dicen en la relación antecedente pa
raliz fmg q. en ella se expresan. Cominaria agüa
12 de Junio 1784.

Son 70 pt. }
+ /

Juan Buño

San
Antem


Real Audiencia de San Juan de los Rios de la Plata
Cofre de la Real Audiencia

7

Relacion en q se manifiestan los Mangles, que se han comprado
 a D. Antonio Elmer para construir la nueva Eracada en la Plaza
 del Callao que vive de Reguanto de la Casa de Administracion de Ren-
 tas y Derramas del Rey. con expresion del numero de ellos y va-
 lor de cada uno.

Por ochenta y siete Mangles que han
 comprado a D. Antonio de Elmer, para obra
 de Obra segun el precio de la Aquana, a razon
 de tres puros cada uno importan

263. 1. 0

Miguel de Estrumiana Subteniente de Infant^a Ingeniero
 Volunt^o encargado del Detall de la D^a obra de Sanificac^{on} de el
 Callao

Certifico que la Cam^a de Doycientos sesenta y un pesos
 Gen esta Plazion se expresan, en la misma que vive a bo-
 naave a D^o sugeto por el importe de los Mangles que
 ha entregado: Por aya q com^o lo firme en la D^a Plaza
 del Callao hoy 23 de Junio de 1786.

B.

Con m^a intervencion

at.º Canabate

Manuel de Tagle Yrarraga

Miguel Estrumiana

Recivi del S.º D. Manuel de Tagle Yrarraga comi-
 sario de Guerra y Ministro de R.^a Hacienda Dos
 Cientos Sesenta y un p.^{os} por el ymporte de ochenta
 y siete Mangles que le he vendido a razon

de tres pesos cada uno, segun ábaluo dela Real
Asuana los que deben servir para la Erta cada
nueva que se construye en la Plaza del Cal
para el Resguardo dela Casa Administracion
de Rentas, y Barracas del Rey Comisario
Guerra y Junio 21 de 1784.

261 p.

Antem

Antonio Helme

Don
Ramón Vidal
Jose de la Cruz

Nº 3.

Relacion en que se manifiesta el importe de una Norma de Papel que se compró a D.ⁿ Vizente Elizaldi: para hacer Relaciones Listas Diarias, pidos, y oficios, que se invierten en la R.^a Obra, que se está construyendo delante de la Casa del Guarda mayor, y Camaraca del Rey con expresion de su valor.

Perros

Por una Norma de papel para el destino expresado que se compró a D.ⁿ Vizente Elizaldi importa 3

D.ⁿ Miguel Cotrimaria Subten.^{te} de Infant.^a
Ingeniero Voluntario, y encargado del Detall de la Real
Obra de Fortificacion del Callao, &c

Certifico que la Cantidad de tres pesos es la misma que deve abonarse a dicho sujeto para los fines expresados; Y para que conste lo firmo en 23 de Junio de 1784.

Con mi Intervencion. Miguel Cotrimaria
Ant.^o Canabatey
Man. de Paolo
Traraga

Heabi el S.ⁿ Jph. Juan. de Sagle Traraga com.^o agüa y
sumo al. & Har.^a los tres p.^{os} q.^{os} se dicen en la Relacion an-
tecedente por la Norma de papel q.^{ue} en ella se expresa. Comita-
ria agüa 21 de Junio de 1784.

Son 3 p.^{os}

Joseph martias de Elizalde

Delacion en que se manifiestan los Jornales que han devengado el
 M^{do} y ofiziales de Carpinteria Empleados en la D^{ta} Obra de Estacada, que se está
 contruyendo en la Playa del Callao, para Resguardo de la Cava que sirve de Admi-
 nistracion de Rentas, y Gaxacav del Rey en esta semana que començo Lunes 23 de
 Junio, y acabó Sabado 26 de dho: con expresion de lo que en ella se ha executado
 ser á saber.



Proximamente se han acerrado cinquenta Mangler por
 ambas cabezas á los que se le han echo sus puntas ávini-
 endoles los runchos para que Riviban el golpe del Marti-
 nete: se han clavado cinquenta y quatro Estacas; tambien se
 han echo veir cuñav para enderezar los Mangler que están
 enxiortando: se ha puesto una fiorta con diez y nueve cla-
 vos de diez y veir á diez y siete pulgadas, y se sigue traba-
 jando.

Jornales que han Devengado los Operarios siguientes

	<u>Dias</u>	<u>Valor</u>	<u>P.^o</u>	<u>R.^o</u>
M ^{mo} Juan Ducio	5	à 10	6	2
José Ramirez	2	à 16	4	0
Fran. ^{co} Berberi	5	à 16	10	0
Clemente Laoliva	4	à 14	7	0
Manuel Porman	5	à 14	8	6
Carimino S. ^a Mig ^a	5	à 14	8	6

Expresion de Jornales } 44 6

Por cinco Jornales	à 10	6	2
Por siete dichos	à 16	14	
Por catorze dichos	à 14	24	6

Expresion de Jornales } 44 6

M^o Miguel de Estramiana Subteniente de Infant^a Ingeniero voluntario y encargado del Detall de las D.^{as} Obras y Fortificacion de el Callao &c.

Certifico que la Cantidad de cuarenta y cuatro pesos y seis reales, que arriba se expresan en la misma que debe abonarse al M^o y oficial de Carpinteria, por el trabajo que tienen devengado en esta D.^a obra; la que se ha executado por disposicion de D.ⁿ Antonio Canabate theniente de Intendente de Ingeniero Extraordinario de los Exercitos de S. M. y Comandante en este Reyno, con intervencion de D.ⁿ José Manuel de Tagle Comandante de Guarnicion de los Exercitos de S. M. Por lo que como la firma en la Plaza del Callao en 26. de Junio de 1784.

V. B.

Con mi Intervencion

Ant.^o Canabate Miguel Estramiana
Man. de Tagle

Recibi el S.^o D.ⁿ Jph. Man. de Tagle Traraga con

Saxis a gr̃a y su m̃o C. V. Har. lo quarenta y
 quatro p. q. se dicen en la Relación anexo de nos pa-
 ra lo p̃ncipal q. en ella se expusieron. Comisaria C.
 gr̃a 26 de Junio de 1784.

Son 44 p. 6a. }

Juan B. V.

Relacion enq. se manifiestan los Tomales q. han devengado el mto.
y ofi. de Campint. a empleados en la H. Obra de Estacada que se
construyeron en la Playa del Callao p.º Reguaron de la Ciudad
que sirve de Administrax.º de Pienas y Barracas del Rey
En esta Semana q. comenzo Miercoles Ba. de Junio y acabo
en dho dia p.º travessa concluso el mes con expmicion de
los Tomales q. han Devengado y es assaver.

Se
Numeram. se han clavado
Ocho Estacas a lav que se le an
Cero sus puntas aviniendoles sus
Sanchof para que Reciban el
Golpo del martinete y se sigue
Travassando.

21
 Torrales q. han devengado los operarios siguientes

	Dias.	Valor	L ^o	R ^o
M ^{ro} . Juan Bucio	1	à 80..	1	2
Bref Parruxes	1	à 86..	2	1
Fran. Co. Berbeni	1	à 86..	2	1
Mam. Roman	1	à 84..	1	6
Cacimio S. Mig.	1	à 84..	1	6
Expresion de Torrales			8	6
Por on Torra.	1	à 80..	1	2
Por do dho.	1	à 86..	4	1
Por do dho.	1	à 84..	3	4
			8	6

Mig. Estreminia sub. te de Inf. Ing.º Volum. y encarga-
 do de Detall de las P. obras y fortificac. del Callao y de

Certifico q. la Cam. de ocho p. seis m. q. arriba se
 expresa es la misma q. debe abonarse al mro. y Of. de
 de Capint. a p. el trabajo q. tienen devengado en otra
 P. obra la q. sea executado. a disposicion de d.º Ant.º
 Carravate Ten. de Inf. a Ing.º Extraord. de lo Exto. de
 M. y Comand. te de dho. Cuerpo en este Reyno con
 intervencion de d.º Jefe Mam.º de Fagle Comis.º de Pna.
 y ministro de P.º Haz.º de lo Exto. de su Mag.º y p.
 q. con esto lo firme en la Plaza del Callao a 3 de
 Junio de 1784

P. B.

Ant.º Canabaty

Con intervencion Miguel Estreminia
 Man. de Fagle
 Vasaga

Recvi al Sr. Comis.º de Pna. y ministro de P.º Hato.

la Cant^a de ocho p^{as} veis y x^{ta} lo mismo q^e andebengado lo
 operario q^e en esta Placion se capta y p^a q^e conate lo
 firme en la Plaza del Callao y Junio 30^a de 1764

8 p^{as} 6 m^{as}

+

Juan BUCIO

14

D. Ant.º Canabate Thom. de Inf. e Inf.º Contracaud. de los Ind.
de S. M. y Comand.º de Dho Cuerpo en este Reyno.

N.º 14

Certifico q. el Sub.º de Inf.º a N.º 14.º de Eximiana
Nombrado Inf.º Volunt.º p.º Sup.º Decreto del Excmo.
Sr. Tiney ha estado empleado en las Obra.º.
del Callao en todo el mes de lastra y p.º q. pueda
percibir la Qualif.º de treinta p.º q. mensualm.º
liene asignado, doy la Rec.º en Lima a 30. de Jun.
de 1784.

Ant.º Canabate
H.º

Pecedi del S.º Comd.º de Lima y m.º de S.º M.º.
treinta p.º p.º la Qualif.º q. Anula se expresa
y p.º q.º Corrite la firma oy 30. de Jun.º de 1784.

Son 30 p.º } +

Miguel Estuñan
(3) (73)

15

Dⁿ Antonio Carrabate Oficiante de Infanteria Ingeniero
Extraordinario de los Ex^{cm}os de S. M. y Comand^{te} de dho Ex^{cm}o en este
Reyno

N^o 15

Certifico que *Dⁿ Nicolas Lazareinaga* Sobre-estante
de las P^{as} Obraz del Calleo ha arivido puntualmente
a ellas cumpliendo todos los encargos, que ha pueno (ano)
a su cuidado el Ingeniero de Detall: Desde el dia prim^o
de Junio hasta el treinta de dho; para q pueda apereceria
el sueldo de treinta pesos: Doy la presente en Lima a
30 de Junio de 1784

Ant^o Carrabate
[Firma]

Reziri del Señor Comisario de Guerra, y ministro de
P^{as} Hacienda treinta pesos pertenecientes al sueldo que goza por
Sobre-estante de P^{as} Obraz: Para que como lo firme hoy 30 de
Junio de 1784.

Son 30 p^{as} }

+

Nicolas Reynaga
[Firma]

H
H

10

Recivi del Sr. D. José Man. de Zúñiga
Comisario de Guerra del Sr. Excmo.
la cantidad de veinte p.^{as} por la gratificac.ⁿ
q.^{ta} tiempo devengada en el presente Mes de
la Hra.

Lima y Junio 30 de 1785

Cor. D. P. / Ant. Canabatey

N^o 16.

Relacion de las Gratificaz^{es} q. han debengado el Causo de Brigada y
 Presos q. se han empleado en la nueva Obra de Obacada q. se esta
 Construyendo delante de la Casa del Guandamox y Barracas del
 Rey con el numero de Presos y valor q. cada uno Paga=

{ Dias de Jun. ^o }	{ Num. ^o de Presos }	{ Gratifi- cacion }	{ Presos }	{ Reales }
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dom. ^o 6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
Dom. ^o 13.	30.	a	h	7-
14.	30.	a	h	7-
15.	30.	a	h	7-
16.				
17.	30.	a	h	7-
18.				
19.	30.	a	h	7-
Dom. ^o 20.				
21.				
22.	30.	a	h	7-
23.	30.	a	h	7-
24.				
25.	30.	a	h	7-
26.				
Dom. ^o 27.				
28.				
29.				
30.	30.	a	h	7-

Causo de Presos Am. Mexicana p.^a nueve dias
 de Gratificacion a xx. cada dia. imp.^{ta} }
 18.

En el Oficio Maximiana Sub. de Inf.^a Ing.^o Volum.^o y en cargo
 del Detall de las St.^{as} Obras de Fortificacion del Callao V.^a

Certifico q^{ue} la Gant^a de diez i ocho p^{er} q^{ue} en esta M^{ay} se en-
 preña en la misma q^{ue} impongan las Qualificac^{iones} dadas a
 los Sres y Cavo de Brigada en otra p^{er} obra la q^{ue} sea
 Executado p^{or} Disposicion de J^{efe} Am^o Camarate Lem^{te}
 de Inf^{te} Inf^{te} Extraord^o de los Exos de S^u M^{aj} y Comand^{ante}
 En este Reyno, con Intervencion de J^{efe} T^{er} H^{on} Man^{te} de Tagle
 Comis^o de Exa y Ministro de S^u H^{on} de los Exos
 de S^u M^{aj} y p^{er} q^{ue} conste lo firme en la Plaza del Callao
 a 30 de Jun^{io} de 1784

Con mi Intervencion

Ant^o Carabatey

J^{efe} Am^o de Tagle
 Traraga

Miguel Estuñian

Recibi el J^{efe} de T^{er} H^{on} Man^{te} de Tagle Traraga com^o de
 Exa y Ministro de S^u H^{on} de los diez y ocho p^{er} q^{ue} se dicen
 en la relacion antecedente por lo y p^{er} q^{ue} en ella se
 expresan com^o ag^{ua} 30 de Junio de 1784.

Con 18 p^{er} {

alargo y como tengo al Antonio Rodrigue

J^{efe} Traraga
