

Mes de Octubre de 1806

Cartas de los Almacenes q. se executan
para Deposito de Polvora, en los Baluartes
de las Murallas de esta Capital

Maderno Unico.

 1770
3/

GM-CO 3.2

CAJ. 35

DOC. 489

Fol. 16

10th. 3

D^o Tomas de Costa Thomas Ten^{te} Coronel del R^o de Indias
 y Ind^{ia} del Excmo. Encargado del Detalle de las Obras de
 Fortificación de esta Capital y Plaza del Callao.

Certifico que el Sr. Almaraz de D^o Jose Ma-
 ría se han sacado veinte y quatro Asagias con
 ciento ochenta y tres varas p.^a las Obras de las Pie-
 puertas de Polvera de la Muralla de esta Ca-
 pital, q.^{ta} 26. de vara importan la cantidad de
 quinientos sesenta y dos p.^a dos r.^{as} y p.^a f. por lo
 Señor como. y Guerra y Marina, se han de
 abono hoy esta en Lima a diez y ocho de A-
 gosto de mil ochocientos seis.

N. 13

Tomás de Costa
 Ncom. de Miangolaxna

Molina

H. D.

Recibi del Sr. Don de Miangolaxna Com^o
 de Guerra y Ministerio p^o del de este Excmo. Excmo.
 quinientos sesenta y dos p.^a dos r.^{as} que acredita la aut.
 Certificación, y gana q.^{ta} se da al D^o por f^omo
 este en el Callao a 30 de Oct. de 1806.

Don 562 pesos. Dos. Tre. Martin de Linares

+

Morley

Relacion de los Jornaleros y Materiales q^e se han invertido en la obra ²del
 Prepuerto de Sol^o del 2^o Baluarte de la Hoguerda en la Portada del Callio,
 en todo el presente de la fha. Acuer.
 Pesos. Reales.

N^o.
 Oficiales q^e han trabajado en este mes.

Gaspar Loayza	4 dias	a 13 rr.	5	4
Domingo Jimenez	4 dias	a 11 rr.	5	4
José Gonzalez	10 dias	a 12 rr.	15	6
Fran ^{co} Martinez	5 dias	a 14 rr.	8	6

Peones.

Bernardo Peña	23 dias	a 6 rr.	17	2
Donifacio Vardey	12 dias	a 6 rr.	9	2
Ant ^o Villavicencio	23 dias	a 6 rr.	17	2
Fran ^{co} Torres	23 dias	a 6 rr.	17	2
Man ^l Flores	23 dias	a 6 rr.	17	2
Juan Vasquez	6 dias	a 6 rr.	4	4
Juan Cordillo	23 dias	a 6 rr.	17	2
José M ^a Valero	23 dias	a 6 rr.	17	2
Pedro Condeza	6 dias	a 6 rr.	4	4
Man ^l Corpa	6 dias	a 6 rr.	4	4
Ant ^o Corpa	6 dias	a 6 rr.	4	4
Juan Corpa	6 dias	a 6 rr.	4	4
José Lazarte	17 dias	a 6 rr.	12	6
Ag ^o Verruvarri	17 dias	a 6 rr.	12	6
Mateo Lusan	6 dias	a 6 rr.	4	4
José Ordoñez	6 dias	a 6 rr.	4	4
José M ^a de Ugarr	6 dias	a 6 rr.	4	4
Javino Aguilar	4 dias	a 6 rr.	3	1
Dom ^o M ^a Zamora	4 dias	a 6 rr.	3	1
Fran ^{co} Molina	14 dias	a 6 rr.	10	4
Fran ^{co} Guerra	4 dias	a 6 rr.	3	1
Ant ^o Guerrero	4 dias	a 6 rr.	3	1
Bartolo Vidal	10 dias	a 6 rr.	7	4
Man ^l Paredes	6 dias	a 6 rr.	4	4
Fran ^{co} Vilota	6 dias	a 6 rr.	4	4
Jgn ^o Villanueva	6 dias	a 6 rr.	4	4
Joakin Calderon	6 dias	a 6 rr.	4	4
Bernardo Mengos	10 dias	a 6 rr.	7	4
Masael Herrera	4 dias	a 6 rr.	3	6

Para alata 263

Pesos. Reales

Suma de la b^{ta} 268

Mannel Miches 4 dias a 6 rr 3
 Miguel Ugarte 5 dias a 6 rr 3
 Jose Torres 4 dias a 6 rr 3
 Velador 14 dias a 2 rr 3
 Al S^{to} M^{te} Magne de ou Chelto 40

Materiales y Enseres.

Por la Conduccion de 12 Alfagias en 6 Carroz 27
 cada a 4 p 4 rr. Cada Carreta
 Por la Conduccion de 11 Carretadas de Tablas 49
 de Roble a 4 p 4 rr. Cada Carreta
 Por 12 Capachos a 2 rr 3
 Por unas Esteras, Palos, Canas y hilo Acares
 to p el Rancho y Papel p las Melaciones 1
 Por 3 Mangos para los Picos a 2 rr
 Por 6 Bateas a 8 rr. Cada una 6
 Por 4 Barras a 20 rr. Cada una 80
 Por 50 Viajes de Piedra de Rio a 4 rr 25
 Por 17 Viajes de Arena a 4 rr 8
 Por 20 Sadrillos a 14 p millar 28
 Por 12 Caisas de Cal a 3 p 4 rr cais 42

523

Don Tomas Costa y Promiso F^{te} del P^o Cuerpo de Ingen^o del Ex^{to} Plazas, y Fronteras de S. M. Encargado del Detalle de las P^{as} de esta Capital, y Plaza del Callao.

Certifico: Que los quinientos veinte y tres tres y medio que constan en la anterior Melacion, son los mismos se han invertido en el presente mes de la fecha, en la del presupuesto de Polvora en el Segundo Baluarte de la izquierda de la Portada del Callao; y para que por el Comisario de Guerra, Marina, y Artilleria se declare la enunciada cantidad: doy la presente en Lima a 10 de Octubre de mil ochocientos seis.

Molina

Tom. de Nicargolana

Tomas de Costa

[Signature]

[Signature]

Sigue el mes de Noviembre
de 1806.

+

CVLTO

REV

Figure de son de l'écriture
de 1806

Relacion de los Tornos y Materiales q^e se han invertido en la obra ^{3a} del
 Puerto de Solvora en el 2.^o Baluarte de la Izquierda de la Puerta de
 Callio, en todo el presente Mes de la fha. ... Madrid. Paseo Real

N.^o 3.
Oficiales q^e han trabajado en este Mes.

Franc ^{co} Martinez	12 dias y m ^o	a 14 rr ^{es}	34	1
José Gonzalez	18 dias	a 12 rr ^{es}	27	"
Pedro José Calderon	3 dias	a 10 rr ^{es}	3	6
Gaspár Loayza	7 dias	a 11 rr ^{es}	9	9
Domingo Wintener	6 dias	a 11 rr ^{es}	8	2
Juan Carmolino	6 dias	a 12 rr ^{es}	9	"
Bernardo Pena	24 dias	a 6 rr ^{es}	18	"
Am ^o Villavieja	24 dias	a 6 rr ^{es}	18	"
Agustin Verrillari	23 dias	a 6 rr ^{es}	17	2
Franc ^{co} Vidal	12 dias	a 6 rr ^{es}	9	"
Franc ^{co} Molina	24 dias	a 6 rr ^{es}	18	"
Franc ^{co} Torres	24 dias	a 6 rr ^{es}	18	"
José M ^a Valero	24 dias	a 6 rr ^{es}	18	"
Juan Gordillo	24 dias	a 6 rr ^{es}	18	"
Manuel Flores	24 dias	a 6 rr ^{es}	18	"
Bernardo Monge	24 dias	a 6 rr ^{es}	18	4
Masael Herrera	18 dias	a 6 rr ^{es}	10	4
Miguel Ugarte	14 dias	a 6 rr ^{es}	13	4
José Barrientos	18 dias	a 6 rr ^{es}	15	6
José Lazarte	21 dias	a 6 rr ^{es}	16	4
José Frenis	22 dias	a 6 rr ^{es}	14	4
José Díaz	6 dias	a 6 rr ^{es}	9	"
Franc ^{co} Sagal	12 dias	a 6 rr ^{es}	14	4
Pedro José Flores	6 dias	a 6 rr ^{es}	7	"
Velador	28 dias	a 2 rr ^{es}	40	"
Alcob ^{te} José Aguiar	seen sueldo		40	"

Materiales.

Por 59. Cajas de Cal a 3 p ^{as} 4 rr ^{es} cañ	206	4
Por 4125 Sadrillos a 14 p ^{as} millar	57	6
Por 64 viages de Piedra de Frio a 4 rr ^{es}	32	"
Por 26 viages de Arena a 4 rr ^{es}	13	"
Por 78. viages de Piedra de Cerro a 12 rr ^{es}	17	"
Por 4 viages de Polvo a 4 rr ^{es}	2	"
<u>Para a la b^{ta}</u>	<u>325</u>	

	Peroc.	
Suma dela 1 ^a	325	
Por la conduccion de 350 Tablas de Chile al Callao, en 12. Mulas a 4 rr. Mula	6	
Por la conduccion de 30 Adueros a 3 p. millar	8	
Por un Pelleso, y Canastax para servir	12	
Por 50. Esteras a 2 rr. Cada una	100	
	352	

Don Tomas Corta y Mones, Teniente 1^o del Sr. Cuerpo de Ingen. del Callao, y Fronteras de S. M. Encargado del Detalle de las P. de Fortificacion de esta Capital y Plaza del Callao.

Certifico: Que lo 8 Ocho cientos, cinquenta y dos pesos al que constan en la anterior Relacion, son los que se han invertido en el presente Mes de la fecha, en el presupuesto de Potvora en el Segundo Baluarte de la Puerta de la Portada del Callao; y para que por el Señor Com. de Guerra, Marina, y Artilleria se satisfaga la Encomienda: doy la presente en Lima y Noviembre de

V. B. y nueve de mil ocho cientos y seis

Molina

Tomas Corta

Com. de Miangobanua

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Relacion de los jornales y Materiales q se han invertido en la
obra del Repuesto del 2º Baluarte de la derecha en la Portada de S.ª Catali-
na en el presente Mes de la fha. de Avarer. Pese. reales.

N.º

Leonei.	Fran. Freyna	12 dias	a 6 rr	9	11
	Cayetano Anieta	12 dias	a 6 rr	9	11
	Antonio Cuman	12 dias	a 6 rr	9	11
	Pablo Castro	12 dias	a 6 rr	9	11
	Domingo Alzamora	6 dias	a 6 rr	4	4
	Victorio Corbero	6 dias	a 6 rr	4	4

Materiales.

Por 16 Carros de sal a 3 p. 4 rr	96	11
Por 59 viages de Piedra de Cerro a 12 rr	88	4
Por 32 viages de Piedra de Rio a 4 rr	16	11
Por 16 viages de Arena a 4 rr	8	11
Por 3 viages p. Conducir Piedra al Rio		6
El Guarnel de S.ª Catalina a 2 rr	11	
Por 110 Millares de Adores a 10 p. milla	110	
Por la Conduccion de 70 Adores a 7 p. m.	49	1
Por 62 Costales de Paja p. el Adore a 2 d.	15	4
	388	6

Formas Costa y Premio Ten. Cor. El Sr. Cuerpo de Ingen. El
Ejército, Plaza, y Fronteras de S.ª M. Encargado del Detalle de la
obra de Fortificación de esta Capital, y Plaza de Callao.

Certifico: Que los trescientos ochenta y ocho pesos seis reales
que constan en la anterior Relacion, son los mismos
que se han invertido en el presente Mes de la fecha, en la
obra del Repuesto de Pulvera en el Segundo Baluarte de
la derecha en la Portada de Santa Catalina; y para que
por el Señor Comisario de Guerra, Marina, y Artillería
se satisfaga la enunciada cantidad: doy la pre-
sente en Lima veinte y nueve de Noviembre de
mil ochocientos ses.

V. B.

Modina

Fran. de Micangolana

Formas de Costa

Sigue el mer. de Emens de 8807.

Relacion de los Jornaleros y Maestros que han invertido en la obra:
del Piquero de Solvona en el 2.^o Balmario de la Logueria de la Poma de
Cullao desde 1.^o de Dic.^{ta} de 806. h^{ta} 3 de Enero de 807. El Cajero

Poros. Reales

Oficiales que trabajaron en esta fha.

Leones

Fran. ^{co} Martinez	11 dias	un ^o a 4 rr	20	1
Gaspar Coayza	24 dias	a 1 rr	33	
Dominico Jimenez	28 dias	a 1 rr	34	3
Juan Carmelino	28 dias	a 12 rr	37	4
Fran. ^{co} Montolla	13 dias	a 2 rr	13	
Bernardo Pena	28 dias	a 6 rr	12	6
Ant. ^o Villavieja	28 dias	a 6 rr	12	6
Fran. ^{co} Molina	10 dias	a 6 rr	7	4
Fran. ^{co} Savat	28 dias	a 6 rr	12	6
José M. ^o Valero	28 dias	a 6 rr	12	6
Fran. ^{co} Gordillo	28 dias	a 6 rr	12	6
Fran. ^{co} Torres	28 dias	a 6 rr	12	6
José Fuenis	28 dias	a 6 rr	12	6
Manuel Flores	5 dias	a 6 rr	5	6
Bernardo Monge	10 dias	a 6 rr	7	4
Fran. ^{co} Barahona	28 dias	a 6 rr	12	6
Pedro José Flores	5 dias	a 6 rr	3	6
Man. ^o Michico	5 dias	a 6 rr	3	6
Agustin Mena	14 dias	a 6 rr	10	4
José Lazarte	19 dias	a 6 rr	14	2
Matteo Camano	20 dias	a 6 rr	12	
Man. ^o Muñoz	20 dias	a 6 rr	12	
Manuel Prozar	20 dias	a 6 rr	12	
Bartolo Achitequi	20 dias	a 6 rr	12	6
Julian Sordero	9 dias	a 6 rr	6	6
Velador	34 dias	a 2 rr	8	4
José M. ^o José Luis Cyacne	En Mer Camp		40	

Materiales y Enseres.

Por 30. Ladillos a 14 p. millar	42	
Por 11. Cairas de sal a 3 p. 4 rr Cair	33	4
Por 10. Ladillos de teclero a 22 p. millar	22	
Por 3 vias de Piedra de Terro a 12 rr vias	33	4
Por 6. Vias de Arena a 4 rr. Vias	3	
Por 5 Vias de Polvo a 4 rr. Vias	2	4
Para alab.	5	81

	Suma de la 1 ^a	Peros	Pagos
Por 1200 Acoves Trianontoy a 10 p. mill.	12000	584	0
Por la sona S. de 2500 Acoves a 8 p. mill.	20000	12	
Por Va labranza 2500 Acoves a 8 p. mill.	20000	20	
Por 2550 Acoves a 20 p. mill.	51000	28	
Por 1 1/2 libra de Aceite de Ballena		175	
Por 2 Canastas y una Fela		0	2
Por la sumpostura de un rico q. se guabio		6	
Por 12 p. q. le tengo dados al Herrero a fu- enta del Erraso de dho. Propuesto		12	
		<u>828</u>	1

Don *Tomás Costa y Promio*, Teniente Coronel del 13.^o Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, Plazas, y Fronteras D. N. M. Encargado del Detalle de las
Obras de Fortificación de esta capital, y Plaza del Callao.

Certifico: Que los Ochocientos veinte y tres pesos y
medio reales que constan en la anterior Relación, son
mismos que se han invertido en la obra que se ejecuta en
el Propuesto de Polvora en el Segundo Baluarte de la
Cuerda de la Portada del Callao entre el Mes de Diciembre
y principio de este; y para que por el Señor Comisario
de Guerra, Marina, y Artillería se satisfaga la enuncada
Cantidad: doy la presente en Lima tres de Enero de
Ochocientos siete.

S. B.

Molina

Con mi Interés.

Tomás Costa

[Signature]

Mar. de Micangolana

[Signature]

Relacion de los Tonnajes, y Materiales q^{se} han invertido en la obra del Propuesto de Polvora en el 2.º Batallante de la Derecha de la Fortaleza de S.^a Catalina, desde 1.º de Diz.^{re} de 1766. h^ata 3. de Enero de 1767. A saber

Oficiales q^{se} trabajaron en esta fha.

			Pesos	Reales
Edmo. Alfuentes	9 dias	a 11 rr.	12	3
Manuel Veliz	8 dias	a 12 rr.	12	11
Aloum. Urrivarri	24 dias ym ^o	a 7 rr.	21	3 1/2
Franc. Reyna	24 dias ym ^o	a 6 rr.	18	3
Capetano Anzieta	24 dias ym ^o	a 6 rr.	18	3
Antonio Cuman	24 dias ym ^o	a 6 rr.	18	3
Pablo Castro	24 dias ym ^o	a 6 rr.	18	3
Victorio Cordero	24 dias ym ^o	a 6 rr.	18	3
José Veliz	24 dias ym ^o	a 6 rr.	18	3
Vizente Buita	9 dias	a 6 rr.	6	6
Felipe Piovac	14 dias	a 6 rr.	14	4
Joaquin Veliz	9 dias	a 6 rr.	9	4
Vela der	34 dias	a 2 rr.	68	4

Materiales y Enseres

Por 60 Ladillos a 14 p. millar	84	11
Por 43 Caisos de Cal a 3 p. 4 rr. Caiso	150	4
Por 5 Viages de Piedra de Serro a 12 rr. Viage	7	4
Por 52 Viages de Piedra de Rio a 4 rr. Viage	26	11
Por 67 Viages de Arena a 4 rr. Viage	34	11
Por la conduccion de 7 Viages de Piedra de Serro de una obra a otra q ^{se} cobró a 9 rr. Viage	2	5
Por id. de 6 Viages de Mezcla de id. a 9 rr. Viage	2	2
Por 30 Adoves triangulos a 10 p. millar	10	11
Por la labranza de 10 Adoves a 10 p. millar	70	11
Por la conduccion de 40 Adoves a 7 p. millar	28	11
Por 18 Cesteras a 2 rr. cada una	4	4
Por 2 Canastas para servir	11	11
Por 221 v. de azerrio de la madera q ^{se} ha de servir para dha. Propuesto q ^{se} componen 3. Anclas 5 v. q ^{se} a 2 p. Tarca ymportan	11	3
Por 37 Gonres para id. a 2 rr. cada uno	11	4 1/2
Por 4 libras de Clavo p. id. a 9 rr. libra	4	4
Por 37 p. dados al carpintero de dha. obra a 1 p.	37	11
	679	4

Don Tomas Costa y Promes, Teniente Coronel del 1.º Cuerpo de Ingenieros del Exército, Plazas y Fronteras de S. M. Encargado del Detalle de las N.º Obra de Fortificacion de esta Capital, y Plaza del Callao.

Certifico: Que los seiscientos setenta y nueve pesos quatro reales que constan en la anterior Relacion, son los mismos

que se han invertido en la obra que se ejecuta en el
castro de Polvora en el Segundo Baluarte de la Vercha
Portada de Santa Catalina, entodo el Mes de Diciembre
y principio de este; y para que por el Señor Comisario
Guerra, Marina, y Artilleria se satisfaga la dicha
cantidad: doy la presente en Lima trece de Enero
mil ochocientos siete.

J. B.

Molina



Tomás de Costa.
on
Con mi interin.

F. Co. de Micangolauca



Razon de los Tornales, y Materiales q. se han invertido en el presente Mes de la fha. en el Presupuesto de Solvora en el 2º Balmarte de la dña. y la Portada de Santa Catalina. Asaver: Pesos Reales

Oficiales q. han trabajado en el pres. Mes.

Fran.º Martínez	18 dias	a 14 rr.	27	
Gaspár Loayza	18 dias	a 13 rr.	23	6
Domingo Jimenez	18 dias	a 11 rr.	20	6
Juan Carmelino	16 dias	a 12 rr.	24	
Petro Sifuentes	1 dia	a 13 rr.	13	3
Mannuel Solis	1 dia	a 12 rr.	12	4
Fran.º Reyna	19 dias	a 6 rr.	14	2
Pablo Castro	18 dias	a 6 rr.	13	4
Victorio Cordero	23 dias	a 6 rr.	17	2
José Solis	23 dias	a 6 rr.	17	2
Cayetano Arrieta	18 dias	a 6 rr.	13	4
Teaguin Velis	18 dias	a 6 rr.	13	4
José M.º Valero	23 dias	a 6 rr.	17	2
Mannuel Prodas	18 dias	a 6 rr.	13	4
Teaguin Proso	18 dias	a 6 rr.	13	4
Ant.º Aizcorbe	18 dias	a 6 rr.	13	4
Ant.º Pontugies	4 dias	a 6 rr.	3	
Bartilo Achintegui	12 dias	a 6 rr.	9	
Ant.º Cumán	14 dias	a 6 rr.	10	4
Mannuel Muñoz	12 dias	a 6 rr.	9	
Velador	22 dias	a 2 rr.	7	
Por el Salario del 1.º en el pres. Mes de Enero			40	

Materiales, y Enseres.

Por 22 Caños de Cal a 3 p. 4 rr. Cois	66	
Por 22 So Cadillos de labrar a 14 p. millar	31	4
Por 11 viages de Piedra de Serro a 12 rr.	16	4
Por 25 id. de Lorilla y Matancanes a 1.º viage	25	7
Por 4 id. de Piedra de Pico a 4 rr. id.	2	
Por 14 id. de Arena a 4 rr. id.	7	
Por 19 Cesteras a 2 rr. cada una	4	6
Por 15 Costales de Pasa a 2 rr. Costal	3	6
Por la fundicion de 8 Alfajias en tres Corretas a 4 p. 4 rr. cada Carreta	13	4
Por la fundicion de 1 Da. Fab. de Chiloe	2	
Por 12 Fardeas de Acerrio a 2 p. Fardea	24	
Por 6 libras de Clavos a 9 rr. libra	6	6
Por 4 docenas y un Dalaestre a 3 p. docena	12	2
Por 17 Gonz. a 2 rr. cada uno	4	2
Por 44 p. al farp. a 6.º en su trabajo	44	1
Por Calzar una Carreta	1	

584

Don Tomas Costa, y Promio, Ten.º Coronel del 1.º Cuerpo de Ingen.

Al Exército, Plazas, y Fronteras de S. M. Encargado del Detalle
de las Pr.^{as} Obras de Fortificación de esta Capital, y Plaza del Callao.

Certifico: Que los Quinientos ochenta y quatro pesos que
están en la anterior Relación, son los mismos que se han inver-
tido en la obra del Prepuerto de Polvora en el Segundo Baluarte
de la Derecha de la Puerta de Santa Catalina, en el presente Mes
de la fecha, y para que por el Señor Comisario de Guerra, se
haga la enunciada Cantidad: doy la presente en Lima
y a diez y siete de Enero treinta y uno de Mil Ocho Cientos siete.

N. B.

Molina

Don Tomás de Córdoba
Con mi Interim.

Fco. de Micangobanxa

+

tallos
el Callao
que con
n inver
Boguan
rente de
a de la
Lima

8

No.

Razon de los Tornateos y materiales q^{se} han invertido en el presente Mes de la fha. en la obra del Propuesto de Polvora, en el 2.^o Baluarte de la Yeguerda en la Portada del Callao. A saber. Pesos Reales.

Oficiales q^{se} han trabajado en el pres.^{te} Mes.

	Fran. ^{co} Martinez	4 dias	a 14 rr.	7	1
	Gaspar Loayza	5 dias	a 11 rr.	6	7
	Domingo Jimenez	5 dias	a 11 rr.	6	7
	Juan Carmelino	1 dia	a 12 rr.	1	4
Ofic. de media	Fran. ^{co} Montolla	22 dias	a 3 rr.	22	
Cuchara	Aguil. ^{er} Varivarri	23 dias	a 7 rr.	20	1
Peones	Bernardo Peña	23 dias	a 6 rr.	17	2
	Ant. ^o Villavicencio	22 dias	a 6 rr.	17	2
	Fran. ^{co} Torres	17 dias	a 6 rr.	12	6
	Fran. ^{co} Sagal	23 dias	a 6 rr.	17	2
	Fran. ^{co} Barrientos	23 dias	a 6 rr.	17	2
	Juan Gondillo	17 dias	a 6 rr.	12	6
	José Freire	23 dias	a 6 rr.	17	2
	José Lazarte	11 dias	a 6 rr.	8	2
	Ant. ^o Poutaguer	8 dias	a 6 rr.	6	
	Julian Cordero	17 dias	a 6 rr.	12	6
	Mateo Camano	6 dias	a 6 rr.	4	4
	Manuel Muñoz	11 dias	a 6 rr.	8	2
	Manuel Procar	5 dias	a 6 rr.	3	6
	Partelo Achutegui	11 dias	a 6 rr.	9	2
	Ant. ^o Cumán	5 dias	a 6 rr.	3	6
	Cayetano Arrieta	5 dias	a 6 rr.	3	6
	Joquin Veliz	5 dias	a 6 rr.	3	6
	Felipe Procar	5 dias	a 6 rr.	3	6
	Velador	28 dias	a 2 rr.	7	

Materiales y Enceres.

Por 4 Cairas de sal a 3 p. ^{as} 4 rr. Cair	14	
Por 750 Ladillos de labrar a 14 p. ^{as} millar	10	4
Por 2 Viages de Polvo a 4 rr. Viage	1	
Por 4 Piedras Vacas a 3 rr. Cada una	1	4
Por 5 Cortales de Pasa a 2 rr. Cortal	1	2
Por 6 Esteras a 1 ^o rr. Cada una	1	1
Por 3 lib. ^{ras} de aceite Ballena, vn Pellejo,	2	
Miel, vna Botisa, y vn Cordel	1	2
Por la Comportura de vna Barreta		
Por la Pintura de dho. Propuesto	9	
Por trescientos setenta y un pesos q ^{se} han im-		
portado las dehnras, clavos, y lizos de toda		
la madera invertida en el Propuesto del	371	
2. ^o Baluarte de la Portada del Callao	662	4


En Testimonio de lo qual, yo Don Juan José de la Cruz, Jefe del 1.^o Cuerpo de Ingenieros, del Exército.

Plazas, y Exonerar de S.M. Encargado del Detalle de las P. Obras de
tificación de esta capital, y Plaza del Callao.

Certifico: que los seis cientos sesenta y dos p. y q.
reales que constan en la anterior Relación, son los
que se han invertido en el presente Mes de la
obra del Puente de Solvora en el segundo Pu.
de la Pontada del Callao; y para que por el vino
rio de guerra, se satisfaga la enunciada canti-
dad presente en Lima treinta y uno de Enero de
Ocho cientos siete.

V. B.

Molina



Con mi interio.

F. Co.
Ram. de Micangolama




Fernando Costa



Sigue el mar de Febreros del 1807.



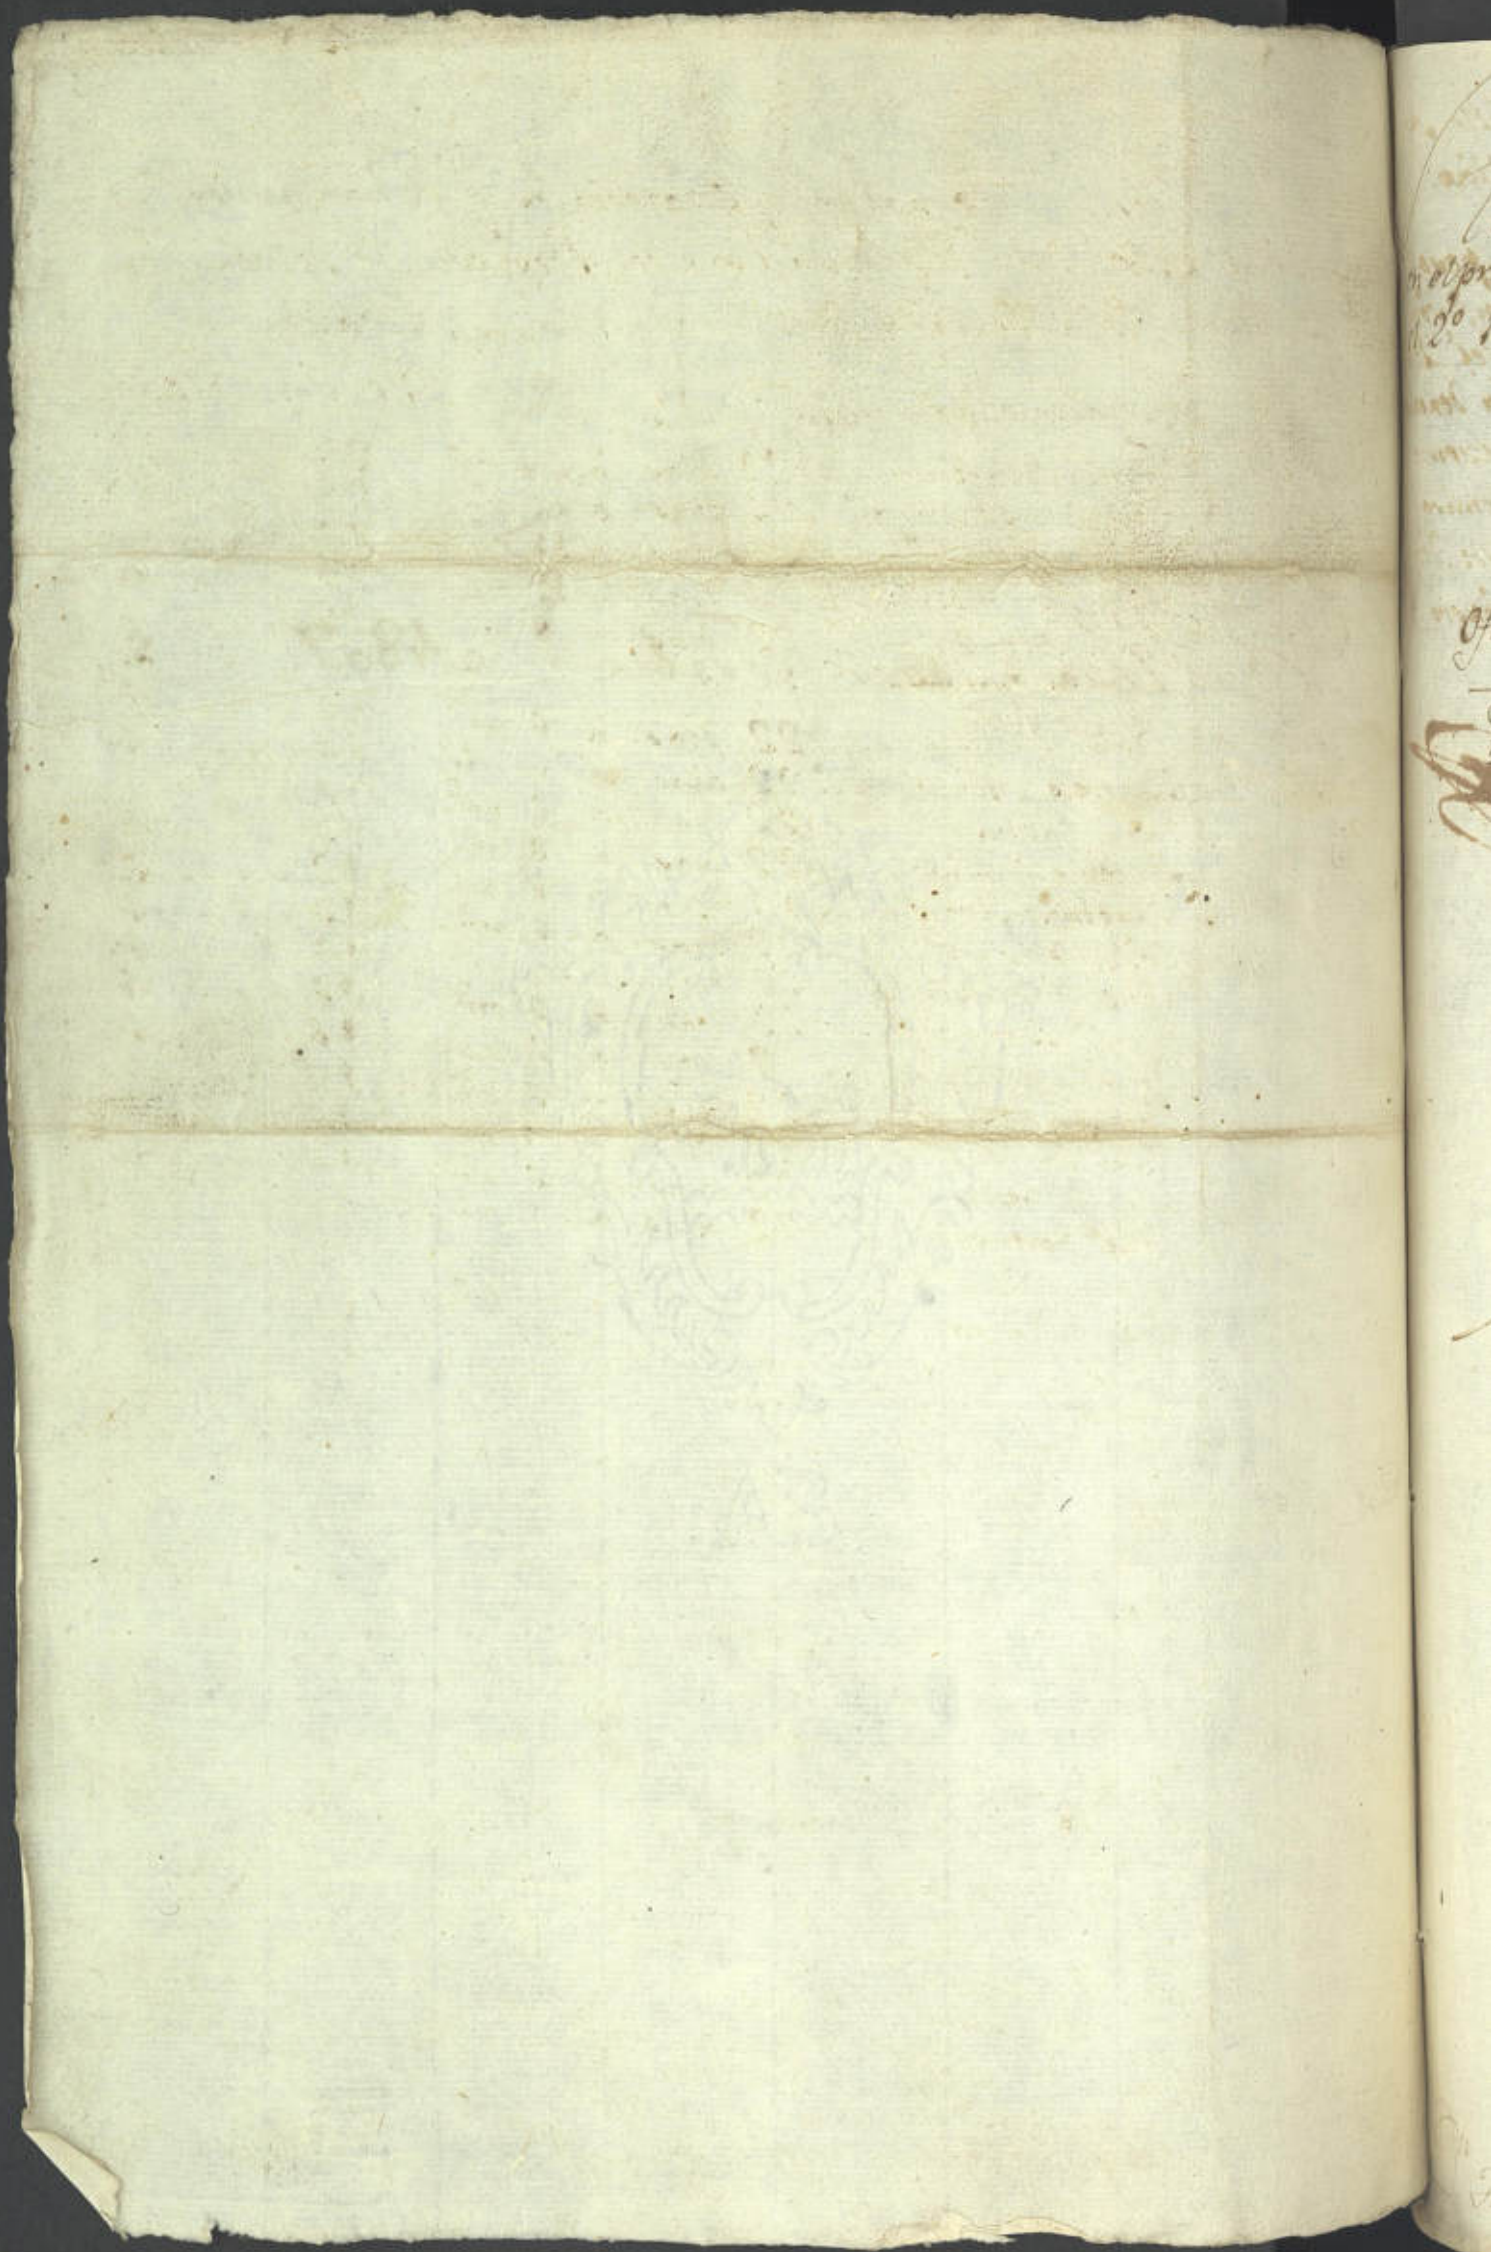

Relacion de los Tornales, y Materiales q^{se} han invertido
en el presente Mes de la fha. en la Obra del Puercito de Polvora, en
2^o Baluarte de la Portada de Sta. Catalina... A saber

Oficiales q ^{se} han trabajado en el presente mes		Personas		Dias	
Ofic. A media Cuchara	Fran ^{co} Martinez	21 dias	a 14 rr	36	6.
	Gaspár Loayza	21 dias	a 11 rr	28	7.
Ofic. A media Cuchara	Domingo Jimenez	21 dias	a 11 rr	28	7.
	Juan Jarmelino	22 dias	a 12 rr	33	4.
Ofic. A media Cuchara	Fran ^{co} Montolla	22 dias	a 8 rr	22	...
	Agustin Univarri	22 dias	a 7 rr	19	2.
Peones	Fran ^{co} Meyna	22 dias	a 6 rr	16	4.
	Barbara Achutequi	22 dias	a 6 rr	16	4.
Peones	Pablo Castro	22 dias	a 6 rr	16	4.
	Antonio Cumán	22 dias	a 6 rr	12	6.
Peones	Cayetano Arrieta	17 dias	a 6 rr	10	4.
	José Solis	22 dias	a 6 rr	16	4.
Peones	Ant ^o Villavicencio	22 dias	a 6 rr	16	4.
	Fran ^{co} Barrionuevo	22 dias	a 6 rr	16	4.
Peones	Fran ^{co} Saúl	22 dias	a 6 rr	16	4.
	José María Valero	22 dias	a 6 rr	16	4.
Peones	Juan Gondillo	22 dias	a 6 rr	16	4.
	Joaquín Velis	22 dias	a 6 rr	16	4.
Peones	Ant ^o Portuñuelo	22 dias	a 6 rr	16	4.
	Manuel Probas	20 dias	a 6 rr	16	4.
Peones	Joaquín Roco	22 dias	a 6 rr	16	4.
	Victorio Condero	22 dias	a 6 rr	14	2.
Peones	Manuel Alvarado	19 dias	a 6 rr	13	6.
	José Ant ^o Alvarado	9 dias	a 6 rr	16	4.
Peones	Bernardo Peña	22 dias	a 6 rr	9	...
	Fran ^{co} Torra	12 dias	a 6 rr	8	2.
Peones	Manuel Alvarado	11 dias	a 6 rr	6	6.
	Manuel Estela	9 dias	a 6 rr	7	...
Peones	Velator	28 dias	a 2 rr	7	...
	Alcald ^e de un Mes Cump ^{te} en la fha.			40	...

Materiales y Chucres

Por 12 Cairas de sal a 3 p ^o 4 rr	42	...
Por 20 Ladillos de labrar a 14 p ^o millar	28	...
Por 10. 12 Saculeros a 28. 12	28	...
Por 16 Viagos de Piedra de Cerro a 12 rr Viago	3	...
Por 6 Viagos de Arena a 4 rr	4	...
Por 9 12. 12 Polvo a 4 rr	4	...
Por 18 Cortales de Pasa a 2 rr Cortal	4	...
Por un par Canastas para servir	2	...
Por 1 lib ^{ra} de Azúcar de Ballena	5	...
Por 5 lib ^{ras} de Plomo a 9 rr. libra	5	...
Por 14 Clavos de Alemaña a 1 rr	14	...
Por 4 1/2 Fanegas de Alcorro a 2 p ^o Fanega	9	...

684

Tomás Costa, y Promico Fontenoncel del P^ol. Cuerno y Ingeniero

del Exercito, Plaza, y Fronteras de S. M. Encargado El Detalle
de las Obra de Fortificacion de esta Capital, y la Plaza del Callao

Certifico que los Seiscientos ochenta y quatro por
medio Real que conotan en la anterior Relacion
los mismos que se han invertido en la Obra del
puerto de Elvora en el Sumo Valuante de la
Puerta de Santa Catalina, en todo el presente
mes de la fecha, y para que por el Señor Com
de Guerra se satisfaga la denunciada Cantidad
la presente en Lima a veint y ocho de Enero
Mil ochocientos y siete.

V B

Molina

Con mi interin

Don Fomay de Costa

H B

Don de Miangolana

f

Si que el mar de Maracaibo del 1807.

Figure 2. 10805

Relacion de los Tornales y materiales q^{se} han invertido en el Pu-
erto de Solvora en el 2º Batallón de la I^{ra} en la Fortada de S^{ta} Catali-
na en el presente Mes de la fecha..... Asaver Pesos Reales

Oficiales q^{se} han trabajado en esta fecha

Juan Martínez	12 dias	a 14 rr	23	
Juan Carmelino	21 dias	a 12 rr	31	4
Doningo Jimenes	12 dias	a 11 rr	16	4
Gaspar Loayza	12 dias	a 11 rr	16	4
Francisco Momiella	21 dias	a 9 rr	23	
Agustin Varivarri	21 dias	a 7 rr	19	3
Francisco Reyna	21 dias	a 6 rr	18	6
Cayetano Atricta	21 dias	a 6 rr	18	2
Pablo Castro	11 dias	a 6 rr	18	6
Daxtelo Achutepui	21 dias	a 6 rr	18	6
Joaquin Proxo	21 dias	a 6 rr	18	6
José M ^{te} Valero	21 dias	a 6 rr	18	6
Ant ^o Villavicencio	21 dias	a 6 rr	18	6
Juan Gordillo	21 dias	a 6 rr	18	6
Victorio Condexo	21 dias	a 6 rr	18	6
Ant ^o Pontuguez	21 dias	a 6 rr	18	6
Manuel Henica	21 dias	a 6 rr	18	6
Francisco Barricentoe	21 dias	a 6 rr	18	6
Francisco Ferrer	21 dias	a 6 rr	18	6
José Veliz	21 dias	a 6 rr	18	6
Manuel Muñoz	21 dias	a 6 rr	18	4
Bernardo Peña	6 dias	a 6 rr	4	4
Francisco Sadal	19 dias	a 6 rr	13	4
Manuel Ortiz	19 dias	a 6 rr	13	4
Joaquin Veliz	19 dias	a 6 rr	13	6
Antonio Luman	9 dias	a 6 rr	7	
Velador	28 dias	a 2 rr	7	
Por el sueldo del S ^{to} de un mes cumpl en la fha			40	

Materiales

Por 13 Caneos de sal a 3 p. 4 rr. Cane	38	4
Por 250 a aduillo de latnar a 4 p. millar	3	4
Por 4 viases de Solvo a 4 rr. viase	2	
Por 17 Cortales de Pasa a 2 rr. Cortal	3	4
Por 2 Pellejos y 4 Piedras vacas a 4 rr.	2	4
Por 8 libras de Aceite de Ballena a 1/2 libra		4 1/2
Por 33 1/2 lib ^{as} de Clavos a 3 rr. libra	18	1 1/2
Por 1 lib ^a de a. de Damasco		4
Por 14 Clavos de Alemosca a 1 rr.	1	6
Por 13 Gonzer a 2 rr. cada uno	4	4
Por 2 1/2 Faneas de averrio a 2 p. Fanea	5	
Por la Conduccion de 2 Alfajias	4	4
Por la Conduccion de unas Tablas de Shiloe	2	
Por 48 p. dados al Herrero y 100 que se le dieron para la Conduccion con 60 p. q ^{se} ha importado el Enrase de ambos Piepuedez	112	
Por 112 p. dados al M ^{te} Carpintero a Cuem	112	
	689	5

Amas Carta y Promis. Con. H^{on}or del M^{te} Cuerpo de Ingenieros

Al Exército, Plazas, y Fronteras de S. M. Encargado del Detalle de las
Obras de Fortificación de esta Capital, y Plaza del Callao.

Certifico: Que los seiscientos ochenta y nueve pesos cinco
reales que constan en la anterior Relación, son los mismos que
han invertido en la Obra del Trepueño de Saluora en el término
ante de la derecha en la Puertada de Santa Catalina, en el mes
de la fecha, y para que por el Señor Comisario de Guerra,
y Artillería, se satisfaga la enunciada cantidad: Dis-
pone en Lima, y Marzo treinta y uno de Mil ochocientos
setenta y siete.

L. B.

Molina

Con mi interm.

Don Tomas de Cordero

H. S.

F. Co.
Ncom. de Micangolana





Segue el mer. de Mayo de 1807

Relacion de los jorn y material q se han invertido en la obra del Hosp. de Polv.
del 2º Puente de la Puerta de Sta Catalina p. en entera conclusion, y algunos
reparos q se hicieron en la Muralla en sus inmediaciones, y la obra duro
todo el anterior Mes, y en este, hñ. la fha. y son. Alvarer

Nñ.

M.

Oficiales q han trabajado en esta fha.

Pesos. Reales.

Juan Carmelino	5 dias	a 12 rr	7	4.
Fran. Montolla	36 dias	a 3 rr	36	..
Agustin Urivarri	29 dias	a 7 rr	37	4.
<u>Reones</u>				
Fran. Reyna	34 dias	a 6 rr	28	4.
Capelano Arrieta	5 dias	a 6 rr	3	6.
Touquin Roro	5 dias	a 6 rr	3	6.
Jos. M. Valero	17 dias	a 6 rr	12	6.
Manuel Munio	5 dias	a 6 rr	3	6.
Am. Villavicencio	36 dias y medio	a 6 rr	27	3.
Victorio Cordero	5 dias	a 6 rr	3	6.
Manuel Muna	23 dias	a 6 rr	18	6.
Fran. Ferrer	36 dias	a 6 rr	27	..
Fran. Baamontoy	33 dias	a 6 rr	24	6.
Fran. Sagal	11 dias	a 6 rr	8	2.
Jos. Salas	17 dias	a 6 rr	12	6.
Velador	20 dias	a 2 rr	5	..
Por el salario del dñe hñ. la fha.			55	6.

Materiales

Por 2 Caisos de Cal	a 27 rr	57	..
Por 2 viages de Polvo	a 4 rr	8	..
Por 2 Faroles con sus Candelas, Candeleros y Corz		15	4.
deles para los dñs. Propuestos		9	..
Por la Pintura de tho Propuesto		..	..
Por la Condu. de la Madera en 6 Carrocerias		7	4.
das a 10 rr cada Carroceria		60	1 1/2
Por la condu. de 1000 Maderas a 9 p. millar		9	4.
Por 3 viages de Piedra a Rio	a 4 rr	12	4.
Por 25 id. de Fierro	a 4 rr	3	..
Por 12 Cortales de Rapa	a 2 rr	24	5 1/2
Por 1 1/2 lib. de Clavos	a 9 rr	13	5.
Por 6 Clavos de Alemonca y 6 de Barrotes		13	4.
Por 6 Goncos	a 2 rr	12	5.
Por las Echuzas de una Puerta, Ventana, con		28	5.
la Chapa, Llave, y ponesta		28	5.
Por 100 Tab. de Albero	a 2 1/2 rr	250	4.
Por 25 y. de Alfagia	q a 4 p. 4 rr	100	..
		550	3.

Don Tomas Costa y Promeco, Fomento Coronel del P. Cuerpo

Don Juan del Corral, Plazas, y Fronteras de S. M. Encargado del De-
partamento de Obras de Fortificación de esta Capital, y Plaza del Callao.

Certifico: Que los quinientos diez pesos y un real, con los
mismos que se han invertido en la obra del presupuesto de
la Puerta de Santa Catalina, y en algunos reparos que
se han echo en la Muralla en sus inmediaciones desde
el Mes de Abril hasta la fecha; y para que por el Se-
ñor Comisario de Guerra, Marina, y Artilleria se sa-
tisfaga la Enunciada Cantidad: doy la presente en Li-
ma, y Mayo trece de mil ochocientos y siete

J. D.

Molina

Con mi interm.

Fernando de Cota

Fco. de Micangalana

+
